

Мольбы родителей остаются без ответа: ремонт школы в Оби застопорился

Контракт на ремонт школы в Оби был заключён ещё в 2022 году, а сделать его должны были в конце июля 2023 года. Но на дворе 2024 год, а здание до сих пор не закончено. Сообщается, то проблема возникла из-за отсутствия средств у подрядчика.

Родители в панике и уже обращались к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Тот, в свою очередь, пообещал ещё в 2023 году решить проблему. Чуда так и не произошло, а по факту срыва сроков ремонта объекта было возбуждено уголовное дело. Теперь ход работ находится под личным контролем прокурора Новосибирской области Александра Бучмана.



МБОУ «СОШ №26»

Контракт между МБОУ «СОШ №26» и ООО «Центр театральных технологий Сибири» (ОГРН 1145476107809) был заключён ещё в мае 2022 года. Сдать объект планировалось к 30 июля 2023 года. Однако отремонтировать в срок, как всегда, ничего не вышло. Сначала дату сдачи перенесли на декабрь 2023 года, после — на конец июля 2024 года, а теперь уже — на 30 октября 2024 года. Подрядчик утверждает, что на сегодняшний день строительная готовность составляет 86%. При этом он сам же и заявил о том, что сроки могут быть вновь перенесены, ведь он не знает, что будет завтра.

Региональное отделение «Народного фронта» лишь оправдывает подрядчика тем, что контракт непростой. Утверждается, что ООО «Центр театральных технологий Сибири» должно было само разработать проект, а после его реализовать. Но так как сам проект не был готов в установленные сроки, пошли переносы его выполнения. Подрядчик вовремя не закупил материалы, и из-за этого началось увеличение расходов. При этом администрация города всякий раз продлевала сроки сдачи объекта и не предъявляла никаких санкций по

отношению к подрядчику.

Естественно, подобное не осталось без внимания родителей. Они обращались напрямую в «Народный фронт», который отправил всё в Контрольное управление Новосибирской области и региональное Министерство образования. На вопрос об объективности переносов никто так и не смог дать внятный ответ, зато целая куча оправданий для подрядчика найдена была. Школа №26 модернизируется по госпрограмме «Развитие образования». Сумма контракта — 127 миллионов рублей. Об остальном более подробно Бабр уже [писал](#).


Бучман в деле

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман поставил на личный контроль ход окончания работ средней образовательной школы №26. Проверкой было установлено и подтверждено сильное отставание от сроков сдачи. Работы должны были закончить ещё в 2023 году, а на дворе уже 2024 год, беспорядок. Но подобное, в общем-то, неудивительно для Новосибирской области. Шесть концессионных школ по-прежнему продолжают простаивать, хотя их уже должны были завершить.



«Александр Бучман поручил незамедлительно принять меры прокурорского реагирования, еженедельно докладывать о ходе ремонтных работ в учебном заведении. Ход окончания работ прокурор области поставил на личный контроль», — утверждает прокуратура.

Будет ли от этого какой-либо результат, покажет лишь время. А пока Бабр продолжит следить за развитием событий.

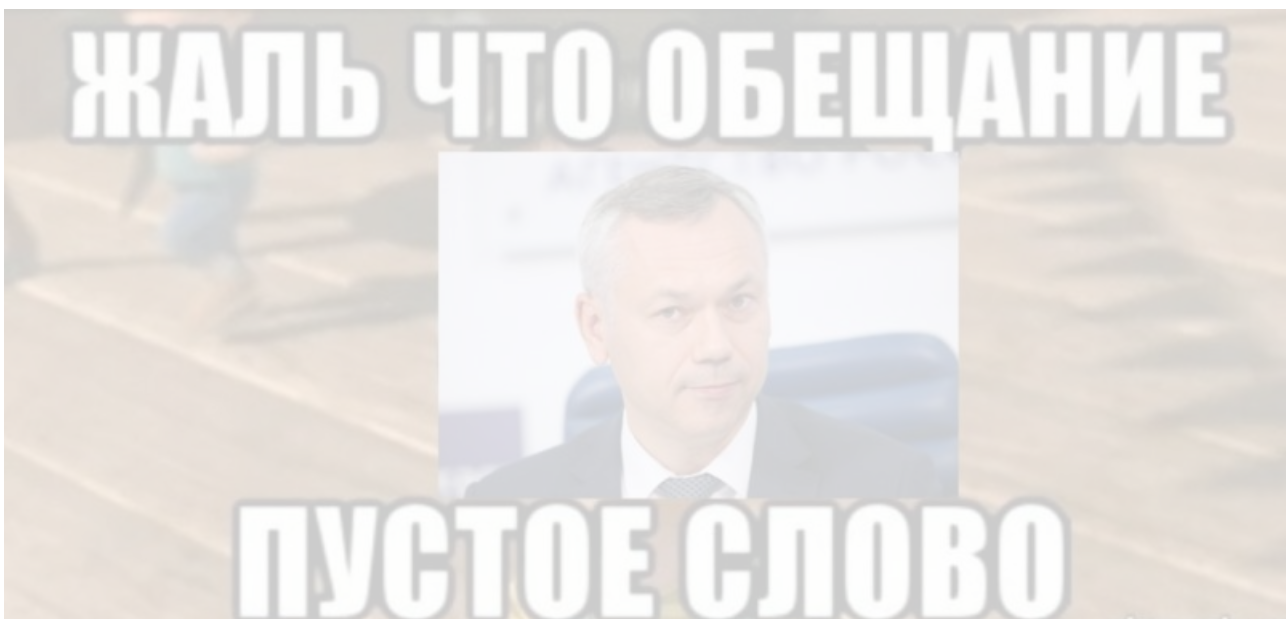

Ранее в материалах Бабра по теме недостроенных школ в Новосибирской области:

[Школьный беспредел, а главное — одобренный](#)

[Рубрика про школы продолжается. На носу проверки](#)

Фото: epp.genproc.gov.ru, dzen.ru

Автор: Адриан Орлов © Babr24.com ОБРАЗОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС, ОБЩЕСТВО, НОВОСИБИРСК
👁 15791 20.08.2024, 22:49 🔄 173

URL: <https://babr24.com/?IDE=263963> Bytes: 3807 / 3268 Версия для печати Скачать PDF

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Новосибирской области:
nsk.babr@gmail.com

Автор текста: **Адриан Орлов.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)
